

臺中市東區區公所驗收紀錄

■全部/□部分

驗收日期:民國109年9月4日

地點:臺中市東區

案號及合約號	10905	廠商名稱	宏大土木包工業		
標的名稱及數量摘要	臺中市東區109年度小型工程	驗收批次	1		
採購金額	☐ 未達公告金額 ☒ 公告金額以上未達查核金額 ☐ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額				
履約期限	應於機關通知日起10日內開工,並於開工之日起50日內竣工				
完成履約日期	109年8月21日	履約有無逾期	☐ 逾期 ☒ 未逾期		
工程金額	新台幣:壹佰貳拾萬元整	契約變更或加減價次數			
[驗收經過]: 驗收位置如下:					
編號	驗收地點	抽驗位置	圖說尺寸	量測尺寸	備註
1	工區一 東區振興里振興路68巷道路改善工程	0K+000~0K+081.8 路面AC長度(L)	81.8 m	81.9 m	符合
		0K+020, 路面AC寬度(W)	3.8 m	3.8 m	符合
		0K+040, 路面AC寬度(W)	3.8 m	3.8 m	符合
		0K+060, 路面AC寬度(W)	3.9 m	3.9 m	符合
		0K+080, 路面AC寬度(W)	3.8 m	3.9 m	符合
2	工區六 東區泉源里樂業國小對面(湖森、湖美中間聯外道路)道路改善工程	0K+000~0K+39.7 路面AC長度(L)	39.7 m	39.7 m	符合
		0K+000.8, 路面AC寬度(W)	16.0 m	16.1 m	符合
		0K+020, 路面AC寬度(W)	8.6 m	8.7 m	符合
		0K+031.2, 路面AC寬度(W)	8.6 m	8.6 m	符合
		0K+039.5, 路面AC寬度(W)	8.8 m	8.8 m	符合
3	工區七 東區東信里振興路296巷(振興路-振興路280巷53弄)道路改善工程	A段 0K+000~0K+070.2 路面AC長度(L)	70.2 m	70.2 m	符合
		0K+019.4, 路面AC寬度(W)	5.2 m	5.2 m	符合
		0K+039.6, 路面AC寬度(W)	3.7 m	3.8 m	符合
		0K+042.5, 路面AC寬度(W)	3.0 m	3.0 m	符合
		0K+069.2, 路面AC寬度(W)	1.7 m	1.7 m	符合
		B段 0K+000~0K+146.3 路面AC長度(L)	146.3 m	146.3 m	符合
		0K+007, 路面AC寬度(W)	6.0 m	6.1 m	符合
		0K+020, 路面AC寬度(W)	3.0 m	3.0 m	符合
		0K+040, 路面AC寬度(W)	2.8 m	2.8 m	符合
		0K+080, 路面AC寬度(W)	2.0 m	2.1 m	符合
		0K+100, 路面AC寬度(W)	3.1 m	3.1 m	符合
		0K+140, 路面AC寬度(W)	3.2 m	3.2 m	符合
		B段 0K+36.8 路面AC厚度(T)	5.0 cm	6.5cm 6.6cm 6.5cm 6.6cm	符合
		B段 0K+120 路面AC厚度(T)	5.0 cm	7.5cm 7.5cm 7.5cm 7.2cm	符合

以下空白





[驗收結果]:

■與契約、圖說、貨樣規定相符。

□與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形。

[改善、拆除、重做、退貨、換貨之期限]:無。

[備註] 隱蔽部份及未抽驗部份由承造、監造負責,准予驗收合格。

紀錄	廠商	會驗人員(無者免)	
課員陳信甫 (簽章)	 專任工程人員  (簽章)	(簽章)	(簽章)
協驗人員(無者免)	本機關監驗人員	上級機關監驗人員 或授權自辦文號 (未達查核金額者免)	主驗人員
 (簽章)	 課員蔡永銘  (簽章)	 (簽章)	 技士邱祺兆 (簽章)

臺中市東區區公所工程結算驗收證明書

填發日期：中華民國109年9月4日

發文字號：

字第

號

案 號 及 契 約 號	10905			廠商名稱	宏大土木包工業		
標 的 名 稱 及 數 量 摘 要	臺中市東區109年度小型工程						
採 購 金 額	☐ 未達公告金額 ☒ 公告金額以上未達查核金額 ☐ 查額金額以上未達巨額 ☐ 巨額						
履 約 期 限	應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起50日內竣工			履 約 地 點	臺中市東區		
開 工 日 期	109 年 6 月 12 日	預 定 竣 工 日 期	109 年 8 月 21 日	不(免)計入工期天數	無		
實 際 竣 工 日 期	109 年 8 月 21 日	開 始 驗 收 日 期	109 年 9 月 4 日	驗收完畢/驗收合格日期	109 年 9 月 4 日		
履 約 逾 期 總 天 數	0天	不 計 違 約 金 天 數	0天	應 計 違 約 金 天 數	0天		
逾 期 違 約 金	新台幣:零元整			其 他 違 約 金	新台幣:零元整		
契 約 金 額	新台幣:壹佰貳拾萬元整						
增 減 價 款	次 別 類 別	第 1 次		第 2 次		合 計	
		金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	110.84	依現況實作數量結算			110.84	
	減少金額	110.84	依現況實作數量結算			110.84	
驗收扣款		無					
結算總價 (金額中文大寫)		新台幣:壹佰貳拾萬元整					
驗 收 意 見	1. 本案經現場抽驗驗收相符，准予驗收；惟隱蔽及未抽驗等其他契約工項部份，由本案主辦(監工)人員等負責。 2. 有關本次工程驗收係依主辦單位竣工報告表，簽請派員驗收辦理，有關履約期限、完成履約日期，由主辦單位人員依契約等規定本權責辦理。 3. 有關本次工程契約數量、契約工項項目、結算(數量)結果、工程(服務費)計算方式與增減金額、辦理期限和逾期違約期日與罰款等，由主辦單位人員依契約等規定本權責確實檢討核實。						
監 造 單 位	承辦單位主管及人員 簽章	本機關監驗人員簽章	上級機關監驗人員 簽章或授權自辦文 號	主 驗 人 員 簽 章			
	課員陳信甫	課員蔡永銘		技士邱祺兆	(機關印信)		
		政風室陳美華 主任	(未達查核金額者免)				

說明：

- 1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說一致樣規相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 6、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 7、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。


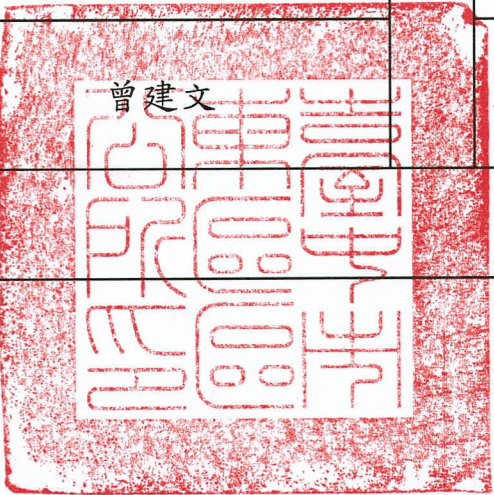
臺中市東區區公所工程結算驗收證明書

填發日期： 中華民國109年9月4日

發文字號：

字第

號

標的名稱		臺中市東區109年度小型工程				
工程概述		道路瀝青混凝土鋪面工程 排水溝改善工程				
工程主要工項 內容及實作數量		工區一：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=81.8M , A=315.81M ² 工區二：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=72.7M , A=273.53M ² 工區三：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=55M , A=247.07M ² 工區四：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=71.7M , A=810.7M ² 工區六：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=39.7M , A=360.47M ² 工區七：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=216.5M , A=717.16M ² 工區八：排水溝改善 L=33M, H=0.5M 工區九：道路刨除暨鋪設5cm厚瀝青混凝土 L=63.6M , A=159.36M ²				
工地 工程 人員	工地主任 (負責人)	曾建文		工程 相關 管理 單位	專案管理 單位	
	專任	施玉梅			規劃單位	
	工程人員				設計單位	 承泰工程技術顧問有限公司
	品管人員	施玉梅			監造單位	 承泰工程技術顧問有限公司
	職安衛	 曾建文				
	人員					
	備註					
(機關印信)						
